

APRESENTAÇÃO À DIRETORIA

Plano de Substituição de Correias Transportadoras

Status do programa e cronograma de regularização por unidade
Nova Mutum · Sinop · Sidrolândia · Balsas

MAIS QUE ENERGIA

Base: levantamento FLEXLAB (jun/2026) + plano de execução | ref. 02/07/2026

Quando cada unidade estará regularizada?

Programa concluído em 30/12/2026 | 46 correias · 3 concluídas · 7 urgentes · 0 vencidas

NMT

Nova Mutum

CONCLUÍDA EM

22/10/2026

16 correias no plano; 1 concluída.
Última substituição em 22/10/2026.

SNP

Sinop

CONCLUÍDA EM

30/12/2026

23 correias no plano; 1 concluída.
Última em 30/12/2026 (esteiras de cavacos).

SDR

Sidrolândia

CONCLUÍDA EM

30/09/2026

2 correias no plano. Ambas concluídas
até 30/09/2026.

BLS


Balsas

CONCLUÍDA EM

24/07/2026

4 esteiras + 1 sobressalente; 1
concluída. Esteiras concluídas até
24/07/2026.

Marcos de conclusão (jul -> dez/2026)

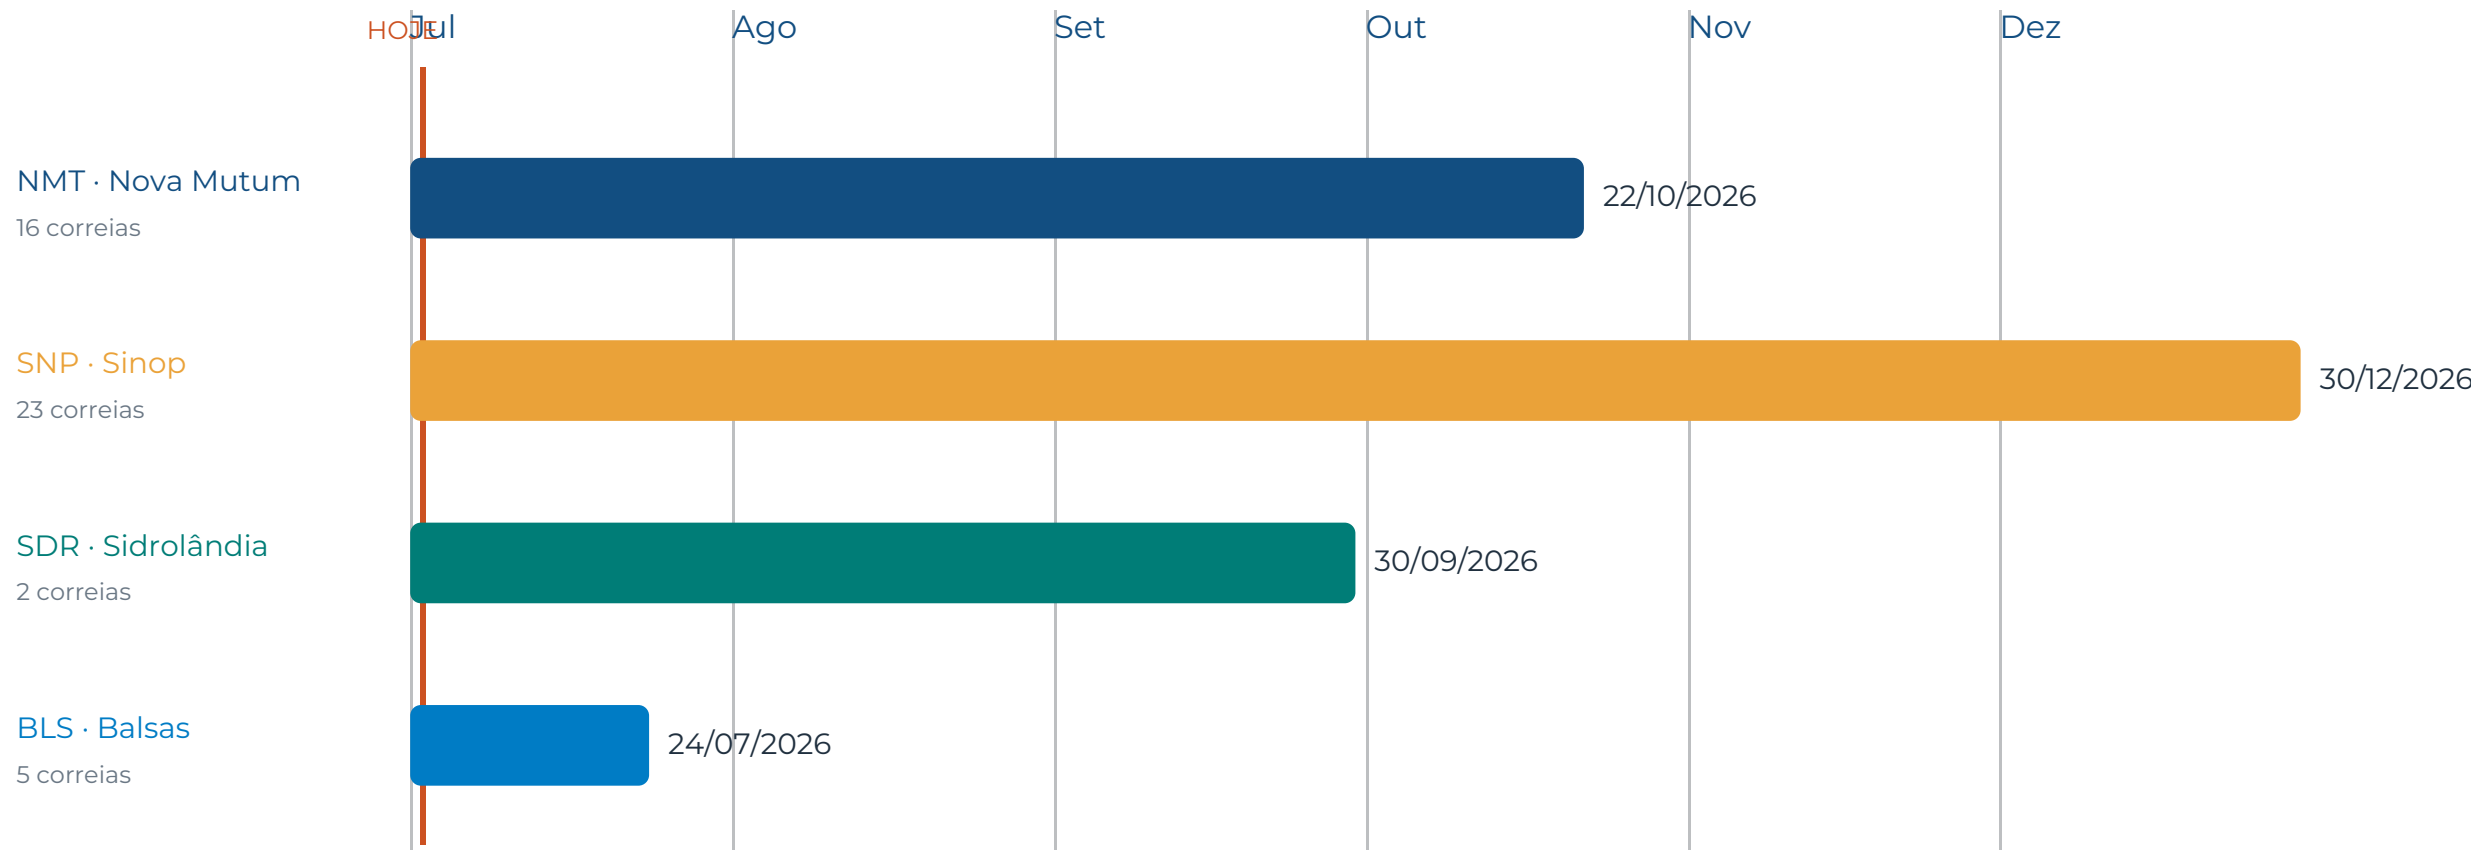

Conclusão de todo o programa: 30/12/2026 (última — Sinop, esteiras de cavacos).

Reconciliação: levantamento × execução

Levantamento FLEXLAB (jun/2026)

- 148 correias auditadas no grupo

102 mantidas em operação

- 46 a substituir -> R\$ 6,15 mi
 - 41 reprovadas ISO 340
 - 5 degradação física

Plano de execução (dashboard atual)

- 46 correias no plano (bate com as 46)
 - 3 já concluídas
 - 43 em execução
- Conclusão: 30/12/2026
 - 0 correias vencidas

Obs.: cadastro do dashboard usa NVM/SDL — padronizar p/ os códigos oficiais NMT e SDR · confirmar unidades DRD e LEM · 1 dos 46 é sobressalente em estoque (45 esteiras físicas).

Cuidado especial até concluir a substituição

Pontos de atenção

- 7 correias urgentes (≤ 30 dias) — biomassa (SNP), DDGS (SDR/BLS), julho.
- Conclusão do programa depende da SNP (esteiras de cavacos, 30/12/2026).
- Biomassa e grãos: maior exposição a incêndio por atrito.
- Janela de transição: risco elevado até a troca de todas as correias.

Encaminhamentos

- PCM acionado para alinhar com TODAS as áreas cuidado reforçado até concluir a substituição.
- Priorizar as correias urgentes de julho (biomassa/DDGS).
- Reporte quinzenal de avanço por unidade.
- Padronizar cadastro (NVM/SDL -> NMT/SDR) e confirmar DRD/LEM.
